

下水道工事に伴う道路陥没事故	令和8年 6月号
復旧工事かわら版	

配布日：令和8年5月29日
清水・日本国土開発・広成JV
広島市下水道局 施設部管路課

令和6年9月26日 西区福島町二丁目で発生した下水道工事に伴う道路陥没事故により、地域の皆さまには大変なご不便とご迷惑をお掛けしておりますが、引き続きご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

《6月の作業内容》

昼間工事（8：00 ～ 18：00）

①止水対策工（凍結工）

凍結管設置工・凍結設備準備工

②追加地盤沈下対策工（地盤改良工）

高圧噴射攪拌工

《その他》

- ・通勤通学時間帯（7：30 ～ 9：00）は大型工事車両の工事ヤード外への搬出（通行）はありません。
- ・緊急時を除き、夜間工事を行う予定はありません。
（夜間工事を行う場合は、別途お知らせします。）

《工程表（予定）》

年月日 工事内容	令和8年6月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①止水対策工 （凍結工）	【昼】凍結管設置工、凍結設備準備工														6月未完了予定															
②追加地盤沈下 対策工 （地盤改良工）	【昼】高圧噴射攪拌工																													

※地表面沈下計測、モニタリングは継続しています。

※第1・第3土曜日、日曜日は原則休工とします。

※週間工程は各所デジタルサイネージに掲載しています。

（JVのHPでも一部情報が閲覧可能です。）

《7月の作業内容》

- ・止水対策工（凍土造成工）：約2か月間

第6回説明会を開催しました

日時：2026年5月16日（土）14時～

場所：西区地域福祉センター

内容：（１）第3回検討委員会の報告

①シールドマシン内部の水抜・土砂撤去・調査計画をご説明しました。

②現在の地盤沈下の状況と追加地盤改良を行うことをご説明しました。

（２）これまでの作業状況・今後の作業予定

今後の工事について、予定している工程や騒音対策等をご説明しました。

説明会後の
現場説明の様子




26名の方にご参加いただきました

説明会資料は
広島市ホーム
ページにてご覧
いただけます



設備配置図（～6/19）

- ・凍結管設置工（水平）
- ・追加地盤改良工

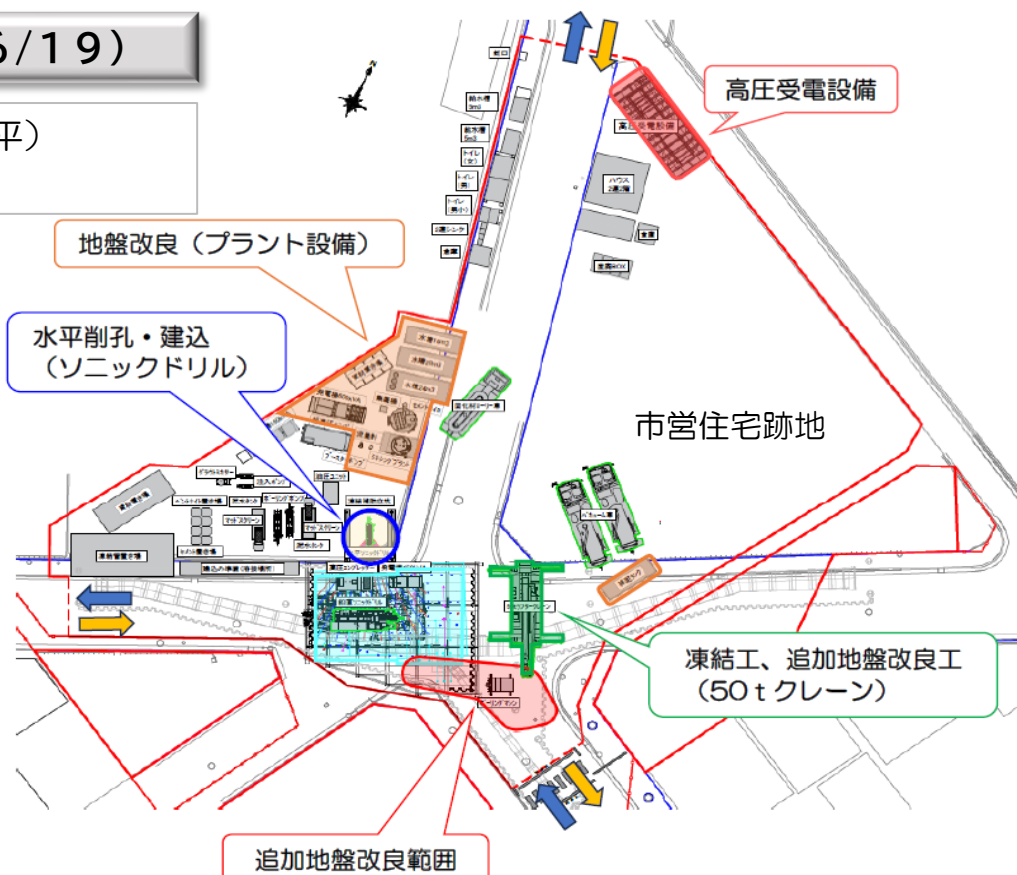

事故に関する情報は下記ホームページにて随時更新していますのでご覧ください。

【清水・日本国土開発・広成JVからのお知らせ】

<https://smz-kannon.movabletype.io/>

【広島市からのお知らせ】

<https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/suido-gesuido/1005966/1043539/1030467.html>

《お問合せ先》

清水・日本国土開発・広成JV
広島市 下水道局施設部管路課

電話 082-555-9275

電話 082-504-2421（平日8:30～17:30）

