

配布日： 令和7年11月27日
 清水・日本国土開発・広成建設工事共同企業体
 広島市下水道局施設部管路課

令和6年9月26日 西区福島町二丁目で発生した下水道工事に伴う道路陥没事故により、地域の皆さまには大変なご不便とご迷惑をお掛けしており、心よりお詫び申し上げます。

地域の皆さまへは、工事の騒音等でご迷惑をお掛けしておりますが、細心の注意を払い工事を進めて参りますので、引き続きご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

《12月の作業内容》

昼間工事（8：00 ～ 18：00）※日曜日は原則休工とします。

①各種復旧工

付帯工（一部鋼矢板・親杭引抜、バイパス管φ800mm撤去・マンホール復旧工）

②止水対策工（凍結準備工）

凍結補助立坑（アーバンリング工法）、凍結補助地盤改良、凍結工事用 路面覆工

夜間工事

- ・緊急時を除き、夜間工事を行う予定はありません。
 - ・夜間工事を行う場合は、デジタルサイネージ内の「週間作業予定」にてお知らせします。
- ※デジタルサイネージは清水・日本国土開発・広成JVのHPでも一部情報が閲覧可能です。

《その他》

- ・通勤通学時間帯（7：30 ～ 9：00）は大型工事車両の工事ヤード外への搬出（通行）はありません。

《工程表（予定）》

年月日	令和7年12月																														
工事内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
①各種復旧工	【昼】一部鋼矢板・親杭引抜																														
	【昼】バイパス管φ800mm撤去・マンホール復旧工														令和8年1月未完了予定																
															令和7年12月未完了予定																
②止水対策工 (凍結準備工)	【昼】凍結補助立坑(アーバンリング工法)																														
	【昼】凍結補助地盤改良														令和7年12月未完了予定																
															【昼】凍結工事用 路面覆工																
地表面沈下計測	【昼】地表面沈下計測、モニタリング																														

※週間工程は各所デジタルサイネージに掲載しています。（JVのHPでも一部情報が閲覧可能です。）

《次号 復旧工事かわら版 発行予定日》

- ・令和7年12月末に発行を予定しております。


《1月の作業内容》

- ・各種復旧工（一部鋼矢板・親杭引抜）
- ・止水対策工（凍結準備工）
 - 凍結補助立坑
- ・仮設工（仮囲い盛替え）

凍結補助立坑工
アーバン立坑圧入のための設備組立状況



バイパス管φ800mm撤去・マンホール復旧工
➡下水道管復旧に伴い、事故直後に設置したバイパス管の撤去とマンホールの復旧を行います。

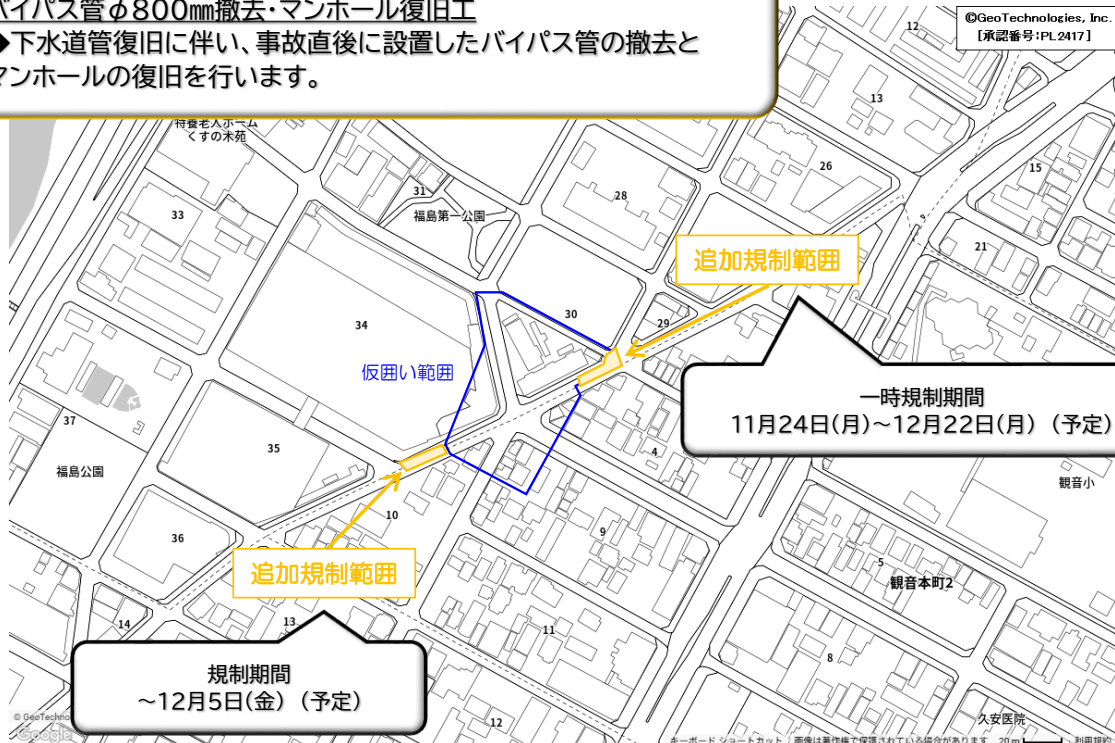

《道路陥没事故に関する情報について》

事故に関する情報は下記ホームページにて随時更新していますのでご覧ください。

【清水・日本国土開発・広成JVからのお知らせ】

<https://smz-kannon.movabletype.io/>

【広島市からののお知らせ】

<https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/suido-gesuido/1005966/1043539/1030467.html>

《お問合せ先》

清水・日本国土開発・広成JV
広島市 下水道局施設部管路課

電話 082-555-9275
電話 082-504-2421

