

復旧工事かわら版

令和8年
10月号配布日：令和8年9月30日
清水・日本国土開発・広成JV
広島市下水道局 施設部管路課

《10月の作業内容》

発進基地内

・土砂撤去工（昼夜2交代制）

発進基地内にて、発進立坑・トンネル坑内の土砂および水没設備の撤去を行います。
大型工事車両の搬入出があります。

交差点部

・凍土維持運転（24時間）

地盤を凍結させるため、凍結機械を24時間運転します。（重機作業なし）

・下水道復旧工（昼間工事8:00～18:00）

損傷した下水道管（小口径）およびマンホールの復旧を行います。

《その他》

- ・通勤通学時間帯（7:30～9:00）および夜間は大型工事車両の搬入出（通行）はありません。
- ・交差点部においては、緊急時を除き夜間工事を行う予定はありません。（夜間工事を行う場合は、別途お知らせします。）

《工程表（予定）》

年月日 工事内容	令和8年10月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
発進基地内 原因究明工 （土砂撤去工） 昼夜2交代制																															
交差点部 止水対策工（凍結工） 24時間																															
交差点復旧工 8:00～18:00																															

※地表面沈下計測のモニタリングは継続しています。

※週間工程等は現地デジタルサイネージ及びJVのホームページにて確認できます。

《11月の作業内容》

発進基地内

・土砂撤去工（昼夜2交代制）

発進基地内にて、トンネル坑内の土砂および水没設備の撤去を行います。

交差点部

・凍土維持運転（24時間）

凍結した地盤を維持させるため、凍結機械を24時間運転します。（重機作業なし）

・下水道復旧工（昼間工事8:00～18:00）

損傷した下水道管小口径およびマンホールの復旧を行います。

発進基地内


原因究明工(水抜・土砂撤去工)

立坑内に溜まっていた水を安全に排出し、
水抜き作業が完了しました。

9/9時点
水抜き前




9/26時点
水抜き後

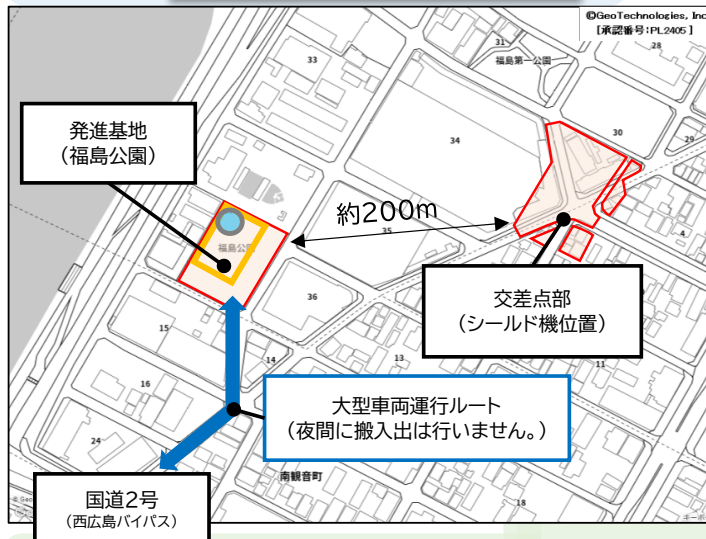



交差点部

交差点復旧工(下水道復旧)

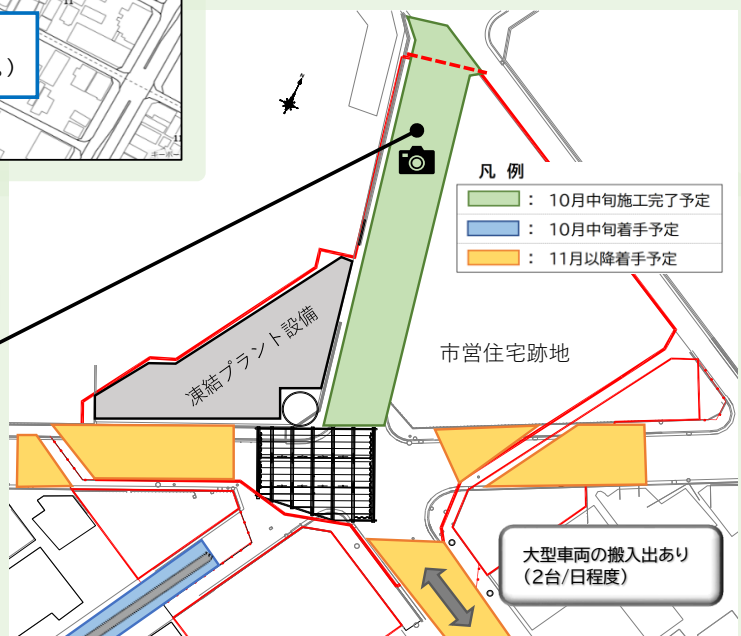

追加地盤沈下対策の効果について

→ 追加地盤改良(令和8年6月)施工後、
地盤沈下は概ね安定しています。
引き続き沈下計測・モニタリングを
継続します。

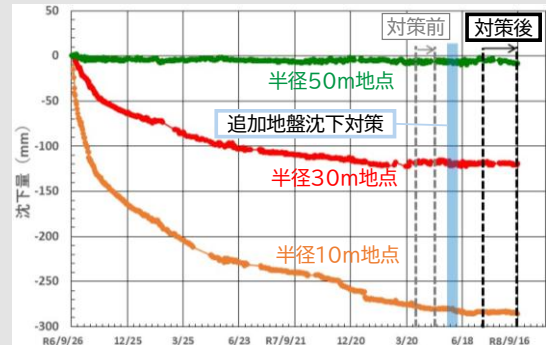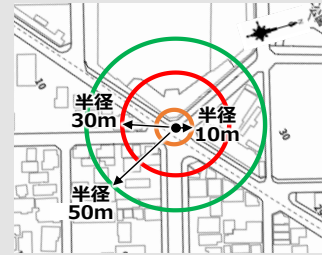

	対策前 (R8/4/8 ~5/8)	対策後 (R8/7/24 ~9/16)
半径 30m	0mm/月	0mm/月
半径 10m	3mm/月	0mm/月

《ホームページ・お問合せ先》

・ 清水・日本国土開発・広成JV



☎ 082-555-9275

・ 広島市下水道局



☎ 082-504-2421
(平日8:30~17:30)
