

下水道工事に伴う道路陥没事故

復旧工事かわら版

令和8年
9月号

配布日：令和8年8月31日
清水・日本国土開発・広成JV
広島市下水道局 施設部管路課

《9月の作業内容》

発進基地内

- ・水抜・土砂撤去工（昼夜2交代制）※裏面に詳細を記載

発進基地内にて、発進立坑及びトンネル坑内の水抜き・土砂撤去を行います。

交差点部

- ・凍土造成・維持運転（24時間）

地盤を凍結させるため、凍結機械を24時間運転します。（重機作業なし）

- ・下水道復旧工（昼間工事8：00～18：00）

損傷した下水道管小口径およびマンホールの復旧を行います。

《その他》

- ・通勤通学時間帯（7：30～9：00）は大型工事車両の工事ヤード外への搬出（通行）はありません。
- ・交差点部においては、緊急時を除き夜間工事を行う予定はありません。（夜間工事を行う場合は、別途お知らせします。）

《工程表（予定）》

年月日	令和8年9月																													
工事内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
発進基地内	【昼】水抜・土砂撤去設備設置																													
原因究明工 （水抜・土砂撤去工） 昼夜2交代制												【昼・夜】水抜工（水抜・復水確認、立坑壁面清掃）																		
交差点部	凍土造成運転 ※重機作業なし																													
止水対策工（凍結工） 24時間												凍土維持運転 ※重機作業なし ※専門業者による運転管理・点検業務を行います。																		
交差点復旧工 8:00～18:00												【昼】下水道復旧工																		

※地表面沈下計測、モニタリングは継続しています。

※週間工程等は現地デジタルサイネージ及びJVのホームページにて確認できます。

凡 例

— : 昼間施工

— : 夜間施工

《10月の作業内容》

発進基地内

- ・土砂撤去工（昼夜2交代制）

発進基地内にて、トンネル坑内の土砂撤去を行います。


交差点部

- ・凍土維持運転（24時間）

凍結した地盤を維持させるため、凍結機械を24時間運転します。（重機作業なし）

- ・下水道復旧工（昼間工事8：00～18：00）

損傷した下水道管小口径およびマンホールの復旧を行います。

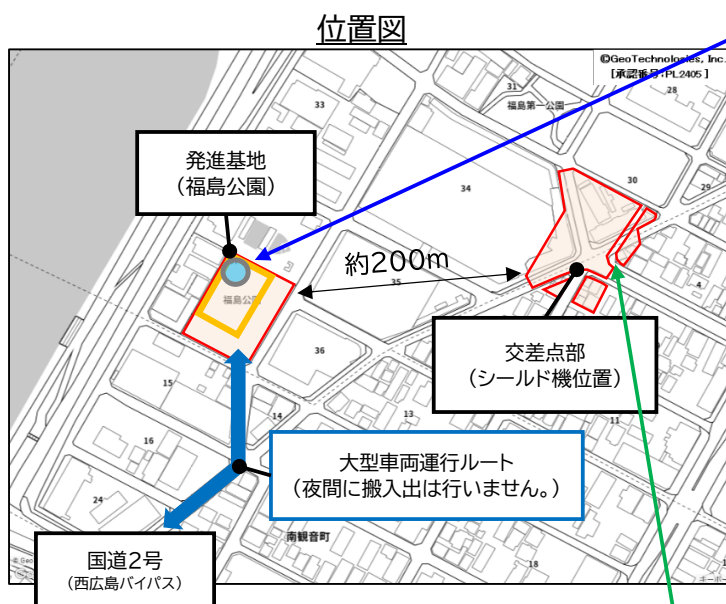


発進基地内

原因究明工(水抜・土砂撤去工)

➡ 防音ハウス内において、
昼夜2交代制での作業を行います。


昼間作業 8:00～18:00

夜間作業 20:00～翌6:00

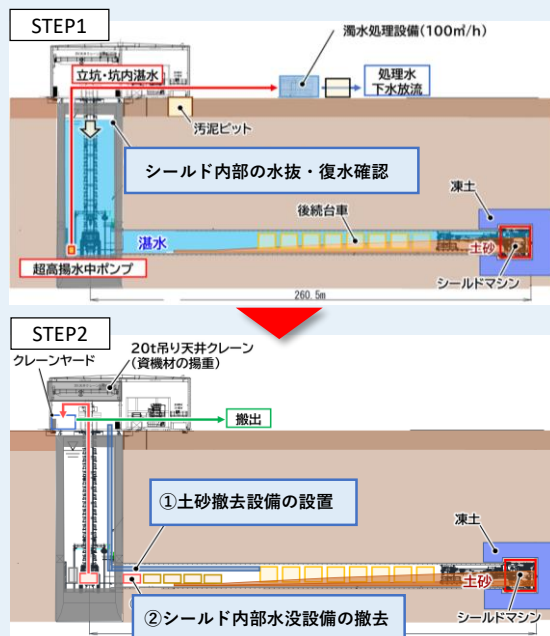

交差点部


《下水道復旧の施工フロー》



超低騒音型・振動型の機械選定



交差点復旧工(下水道復旧)

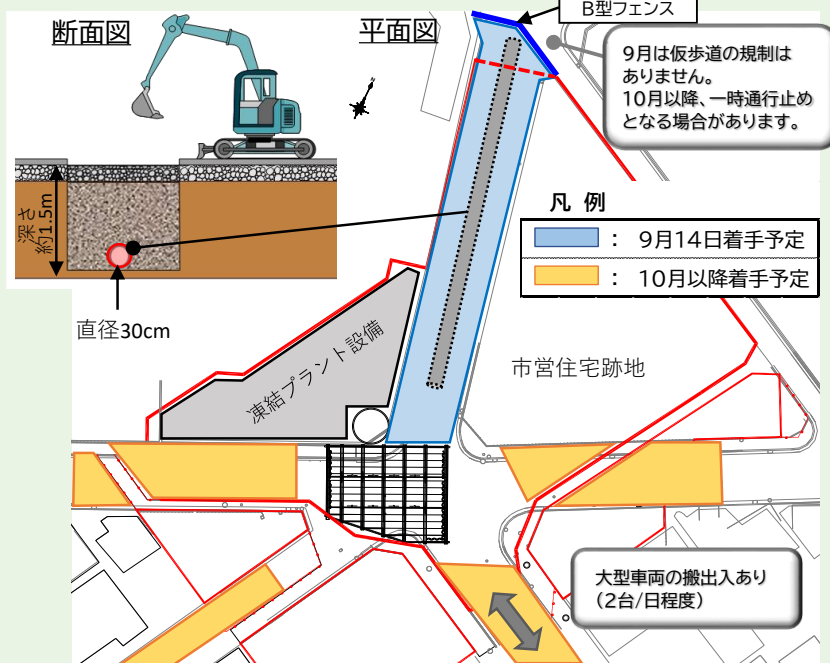

《ホームページ・お問合せ先》

・清水・日本国土開発・広成JV



☎ 082-555-9275

・広島市下水道局



☎ 082-504-2421
(平日8:30～17:30)
